

平成 30 年 3 月 16 日

工 事 定 期 監 査 及 び 出 資 団 体 工 事 監 査 結 果 報 告

〔 行財政局，市民参画推進局（区役所含む），経済観光局，建設局，
住宅都市局，教育委員会事務局，公立大学法人神戸市外国語大学 〕

神戸市監査委員	谷	口	時	寛
同	吉	田	基	毅
同	壬	生		潤
同	平	井	真	千 子

地方自治法第 199 条第 1 項，第 2 項，第 4 項及び第 7 項の規定に基づき実施した平成 29 年度第 2 期工事定期監査及び出資団体工事監査について，同条第 9 項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり決定した。

目 次

1	監 査 の 対 象	3
2	監 査 の 期 間	3
3	監 査 の 方 法	3
4	主 な 監 査 項 目	3
5	監 査 の 結 果	4

○指摘事項

(1) 重点項目「工事の安全管理」

ア	ロープ高所作業の安全確保	5
イ	高所作業時の安全対策	6
ウ	解体作業時の危険防止	7
エ	掘削作業時の土留め	8

(2) 積 算

ア	仮設鋼材の計上	9
イ	コンクリート杭の材料単価	9

(3) 施 工

ア	コンクリート打設	10
イ	過積載防止対策	11

○抽出状況表他	12
---------	----

1 監査の対象

行財政局，市民参画推進局（区役所含む），経済観光局，建設局，住宅都市局，教育委員会事務局，公立大学法人神戸市外国語大学における平成 28 年度及び 29 年度施行工事について監査を行った。

工事の抽出状況は第 1 表，抽出工事は第 2 表のとおりである。

2 監査の期間

平成 29 年 10 月 24 日～平成 30 年 3 月 16 日

3 監査の方法

監査は，土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているか，また経済性，効率性，有効性，正確性，安全性及び透明性などの観点から適切に行われているかについて，関係書類の審査，現場の施工状況の調査及び関係職員に対する質問等の方法により実施した。

4 主な監査項目

- | | |
|----------|---|
| (1) 計画 | 計画書，事前協議及び諸手続きの状況 |
| (2) 設計 | 関係法規等の適用，設計基準等の整備状況及びその運用，
設計図書の整備，設計の照査 |
| (3) 積算 | 積算基準等の整備状況及びその運用，工種・数量・単価・歩掛り等の適用，
積算の照査 |
| (4) 契約 | 契約締結手続き，設計変更等の理由，手続き及び内容 |
| (5) 施工 | 工事関係法規等，施工管理，工事関係書類，監督業務 |
| (6) 検査 | 検査関係書類 |
| (7) 維持管理 | 保守点検関係書類 |
| (8) 委託業務 | 委託業務関係書類 |

5 監査の結果

監査の結果、対象となる局・団体の抽出工事の実施に関する全般的な事務処理は、おおむね適正に行われているものと認められた。

重点項目として監査を行った「工事の安全管理」は、市民や工事関係者の安全・安心に関わる重要な事項であるため、発注者として安全管理の徹底と請負人への指導をより主体性を持って行うべきである。その前提となる法令や各種基準については社会情勢の変化等も踏まえ、平素からの的確に把握し理解するよう努められたい。その上で、監督業務の重要性に関する認識と監督業務を的確に行うための技術力を高めるよう、監督職員に対し日常的な指導を徹底するとともに、パトロールの強化など、引き続き安全意識の向上に向け効果的な対策を推進されたい。特に解体工事については、指摘が続いていることを踏まえ、発注者として建設工事と同等の主体性を持って行うべきであり、適切に実施されたい。

一方、積算については、工事の予定価格を設定する基本的な事項であるため、個々の職員のさらなる能力向上に加え、組織的な照査体制を構築することにより、違算等の防止に努めることが重要である。

その他、事務の一部について、次のような改善を要する事例があったので、今後、適正な事務処理に努められたい。

○ 指 摘 事 項

(1) 重点項目「工事の安全管理」

ア ロープ高所作業の安全確保

本工事は中央区の豪雨で被災した道路のり面の復旧工事である。

のり面にロープ 1 本をつり下げて身体を保持する高所作業を行ったが、労働安全衛生規則に違反する作業であった。

平成 28 年 1 月 1 日から改正・施行された「ロープ高所作業」に関する労働安全衛生規則では、ロープ高所作業における墜落防止措置の多重化として、作業中に常時荷重のかかる作業用のメインロープ（身体保持用の親綱）と、作業中に荷重がかからない安全帯の取付設備としてのライフライン（墜落防止用の親綱）による 2 系統の安全確保が義務付けられている。

しかし、本工事においては、1 系統の状態で作業を行った。

発注者と請負人双方が事前に現場の作業条件や安全性ならびに関係法令を確認し、必要な安全対策等を講じて事故の未然防止に努めるよう、発注者による安全管理の徹底と請負人への指導を行うべきである。



(建設局中部建設事務所)

[No.12 布引大龍寺線法面復旧工事]

(請負金額 12,614 千円)


イ 高所作業時の安全対策

本工事は北区の河川における護岸の新設工事である。

コンクリート擁壁（高さ：2.00～2.02m，天端幅：0.3～0.31m）の出来形寸法の測定時において，高さ2mを超える高所での転落防止の措置が講じられていなかったり，移動はしごの代わりに閉じた状態の脚立を使用したりしていた。

いずれも，不安定な姿勢のため，バランスを崩すと転落する危険性の高い作業であり，不適切である。

発注者と請負人双方が事前に現場の作業条件や安全性を確認し，必要な安全対策等を講じて事故の未然防止に努めるよう，発注者による安全管理の徹底と請負人への指導を行うべきである。

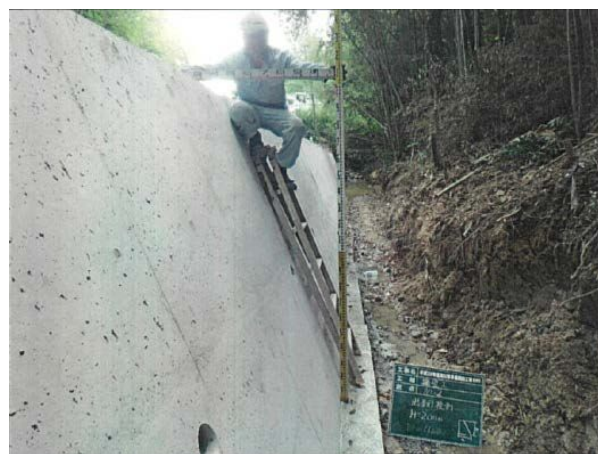

（建設局北建設事務所）

〔No.14 平成28年度河川等単価契約工事（その1）〕

（請負金額 86,708 千円）

ウ 解体作業時の危険防止

本工事は、中央区の福利厚生施設の解体撤去工事である。

解体作業について、請負人は、労働安全衛生規則に基づき、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による作業員の危険を防止するために、立入禁止区域の設定等を示した作業計画を定め、当該作業計画により作業を行わなければならない。また、解体用機械を用いて作業を行う場合、物体の飛来等により作業員に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の作業員を立ち入らせてはいけない。

しかし、本工事では、作業計画（施工計画書）において立入禁止区域の設定をしなかった。

請負人は、作業員の危険を防止するための立入禁止区域を適切に作業計画（施工計画書）に定めるとともに、発注者と請負人双方が作業計画（施工計画書）に基づいて事前に作業手順や安全性を確認し必要な安全対策等を講じるよう、発注者による安全管理の徹底と請負人への指導を行うべきである。



（住宅都市局建築技術部建築課）

[No.58 みなとじま会館解体他工事]

（請負金額 153,358 千円）

エ 掘削作業時の土留め

本工事は、西区における学校施設の電気設備改修工事である。

地盤を掘削する際、土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、その深さが 1.5m を超える場合には原則として土留めを行うこととされているが、適切に土留めが施工されていなかった。

必要な安全対策等を講じて事故の未然防止に努めるよう、発注者による安全管理の徹底と請負人への指導を行うべきである。



管路掘削において、土留め
が施工されていない
(掘削深さ：約 2.0 m)

(住宅都市局建築技術部設備課)

[No.91 神戸市立工業高等専門学校受変電設備改修工事]

(請負金額 53,562 千円)

(2) 積 算

ア 仮設鋼材の計上

本工事は長田区の下水処理場築造工事である。

本体仮設工における山留材の積算において、火打ブロックを使用していた。積算基準では、主部材の計算において火打ブロック等の質量を控除することとなっているが、控除していなかった。

適切に積算すべきである。

なお、設計委託の成果品（数量計算書）においても支保工における切梁を計上しているが控除対象となる火打ちブロック等の整理が不十分であった。違算をなくすためにも、設計成果品においても控除対象をわかりやすく整理されたい。

（建設局下水道部施設課）

〔No.37 西部処理場高段ポンプ棟他築造工事（土木）〕

（請負金額 3,262,582 千円）

イ コンクリート杭の材料単価

本工事は西区の下水処理場における設備の基礎工事である。

基礎工事に使用したコンクリート杭のうち24本は、物価資料の掲載価格を材料単価としたが、その掲載価格が大口の取引数量（100本程度）に基づいた実勢価格であったため、小口の少量取引となる本工事の材料単価として使用するには割安な価格となり、積算額が過小となった。

物価資料の掲載価格はそのまま使用するのではなく、取引数量を考慮したうえで採用の適否を判断しなければならない。

本工事におけるコンクリート杭の材料単価の採用にあたっては、物価資料には小口の少量取引による価格の掲載が無いため、見積り徴集による必要があった。

物価資料の取り扱いについては十分に注意して、適切に積算すべきである。

（建設局下水道部施設課）

〔No.39 玉津処理場消化ガス精製設備他築造工事（土木）〕

（請負金額 35,913 千円）

(3) 施 工

ア コンクリート打設

本工事は北区の青線水路の災害復旧工事である。

プレキャストL型水路の基礎コンクリート部において、滞水を生じた状態でコンクリートを打設していた。また、水路底版部の現場打ちコンクリート部において、鉄筋に泥が付着している状態でコンクリートを打設していた。



コンクリート打設に先立ち、たまっている水を取り除くとともに、鉄筋についてもどろ等の付着がないように清掃してからコンクリートを打たなければならない。

適切な施工管理を実施するとともに、請負人への指導を徹底すべきである。

(建設局北建設事務所)

[No.16 淡河町勝雄(青線水路)災害復旧工事]

(請負金額 24,481 千円)

イ 過積載防止対策

本工事は、兵庫区の土地区画整理事業における仮設住宅の解体撤去工事である。

請負人は、建設資材廃棄物等の運搬にあたっては、道路運送車両法で定められた最大積載量を遵守するとともに、本市で平成 24 年 10 月に策定した過積載防止対策要領に基づき、過積載の防止対策を講じなければならない。

しかし、搬出車両記録表によると、コンクリートがらやアスファルトがらについて、車両の最大積載量を超えていた。

また、施工計画書には過積載防止対策の具体的な記載がなかったうえに、監督員が過積載を確認しておらず改善指導が行なわれなかった。

関係法令等を遵守し、必要な過積載防止対策を講じるよう、発注者による安全管理の徹底と請負人への指導を行なうべきである。

(住宅都市局市街地整備部浜山都市整備課)

[No.59 金平町 2 丁目西団地仮設住宅とりこわし工事]

(請負金額 9,273 千円)

第 1 表 抽 出 状 況 表

工 事 定 期 監 査

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
行 財 政 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	34	386,620	5	195,912	14.7	50.7
市民参画推進局 (区役所含む)	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	12	199,025	2	38,894	16.7	19.5
経 済 観 光 局	土 木	7	235,427	2	78,697	28.6	33.4
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	11	66,343	2	11,039	18.2	16.6
建 設 局	土 木	147	35,231,804	28	25,294,741	19.0	71.8
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	100	6,804,886	11	1,844,193	11.0	27.1
住 宅 都 市 局	土 木	17	588,845	4	320,307	23.5	54.4
	建 築	179	20,374,216	17	1,809,397	9.5	8.9
	設 備	227	10,208,320	22	756,030	9.7	7.4
教育委員会事務局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	16	86,056	4	20,730	25.0	24.1
計		750	74,181,542	97	30,369,940	12.9	40.9

出資団体工事監査

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
公 立 大 学 法 人 神 戸 市 外 国 語 大 学	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	2	51,039	1	31,294	50.0	61.3
	設 備	2	26,889	2	26,889	100.0	100.0
計		4	77,928	3	58,183	75.0	74.7

合 計

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
計		754	74,259,470	100	30,428,123	13.3	41.0

備 考：(1)監査対象工事は、請負金額250万円以上のものとした。

(2)本表は、平成29年9月30日時点における各局及び出資団体からの提出資料に基づき作成した。

第 2 表 抽 出 工 事 一 覧 表

行財政局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	1	本庁舎 設備管理業務	(株)三木美研舎	151,200	H28.4.1	H31.3.31	指名
	2	本庁舎1号館 ゴンドラ設備整備業務	日本ゴンドラ (株)大阪営業所	3,888	H28.8.29	H29.3.15	随契
	3	本庁舎 パッケージ型エアコン保 守点検業務	(株)温調サービ ス	5,400	H29.4.1	H30.3.31	指名
	4	本庁舎1号館 エレベーター保守点検業 務	三菱電機ビル テクノサービス(株)関西支社	21,924	H28.4.1	H29.3.31	随契
	5	本庁舎 非常用発電機設備整備業 務	三菱電機プラント エンジニアリング(株) 西日本本部	13,500	H28.9.26	H29.3.31	随契

市民参画推進局（区役所含む）

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	6	中央区総合庁舎 設備総括管理業務	(株)三木美研舎	31,680	H28.4.1	H30.3.31	指名
	7	須磨区役所 設備管理業務	神戸ダイヤモンド メンテナンス(株)	7,214	H29.4.1	H30.3.31	指名

経済観光局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	8	垂水漁港岸壁 耐震補強工事（その1）	(株)マツモトエン 지니어リング	55,078 (69,874)	H28.9.13 (H29.2.9) (H29.3.17)	H29.2.20 (H29.3.22)	制限

経済観光局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	9	須磨浦アクセス道路 整備工事(3工区)	(株)共栄土木	6,890 (8,823)	H28.12.14 (H29.3.27)	H29.3.31	随契
設備	10	東部市場第2冷蔵庫棟 搬送設備整備	(株)ダイフク サービス本部	8,210	H28.12.14	H29.3.30	随契
	11	栽培漁業センター 急速ろ過装置内ろ材入替 え業務	神鋼環境メン テナンス(株)	2,829	H28.12.21	H29.3.10	随契

建設局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	12	布引大龍寺線 法面復旧工事	日本ロード・ メンテナンス (株)	10,692 (12,960) (12,614)	H28.9.5 (H28.11.30) (H28.12.13)	H28.11.30 (H28.12.22)	指名
	13	宗高第6堰堤補修工事	緑建工業(株)	9,072 (13,878)	H28.12.2 (H29.3.27)	H29.3.31	制限
	14	平成28年度河川等 単価契約工事(その1)	(有)神輝テック	86,708	H28.4.1	H29.3.31	制限
	15	樋谷川改修工事(池谷工区) その9	(株)島田組	79,585 (75,502) (82,058)	H28.12.20 (H29.3.27) (H29.5.25) (H29.7.26)	H29.6.30 (H29.7.31)	制限
	16	淡河町勝雄(青線水路) 災害復旧工事	(株)HOURYU	23,127 (23,427) (24,481)	H28.12.15 (H29.1.27) (H29.3.28)	H29.3.15 (H29.3.30)	制限
	17	樋谷川(二ツ屋)護岸工事	(株)マツモトエン 지니어リング	57,132 (53,708)	H28.10.4 (H29.2.7)	H29.3.31	制限
	18	下水道施設小規模工事 [単価契約・その6]	(株)福島組	123,284	H28.10.1	H29.3.31	制限

建設局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	19	明石木見線街路築造に伴う 污水管布設工事 (その3)	日本海工(株)	16,502 (17,830)	H27.12.10 (H28.9.13) (H28.11.28)	H28.9.30 (H28.11.30)	制限
	20	三宮町1丁目地区污水管 改築更新工事	(株)秋山組	85,168 (100,050)	H28.1.28 (H28.10.26)	H28.10.31	制限
	21	中道通2丁目地区他污水 管改築更新工事	北浦建設(株)	148,878 (150,988) (145,404)	H28.2.15 (H28.2.22) (H28.12.22)	H29.1.20	制限 (総評)
	22	塩屋町5丁目地区他 污水管改良工事	エフアール ビーサポート サービス(株)	166,309 (187,347) (191,991)	H28.3.17 (H29.3.23) (H29.6.14) (H29.8.21) (H29.9.15)	H29.3.31 (H29.6.30) (H29.8.31) (H29.9.20)	制限
	23	桜ヶ丘町地区他 污水管改良工事	大工園設備工 業(株)	57,996 (62,640)	H28.7.5 (H29.1.23)	H29.1.31	制限
	24	駅南通3丁目地区他 污水管改築更新工事	(株)塩屋基礎	66,718 (78,706)	H28.7.19 (H29.1.23)	H29.1.31	制限
	25	鈴蘭台北町1丁目地区他 污水管改良工事(その 2)	(株)山田工務店	82,191 (76,629)	H28.7.28 (H29.3.21)	H29.3.31	制限
	26	青葉町1丁目地区他 污水管改築更新工事	(有)リバーツ リー開発	101,822 (114,123)	H28.8.3 (H29.3.9) (H29.4.25)	H29.3.31 (H29.5.9)	制限
	27	御影塚町4丁目地区他 污水管改築更新工事	岡野建設工業 (株)	172,257 (179,655)	H28.9.16 (H29.6.6) (H29.8.30)	H29.7.31 (H29.9.8)	制限
	28	楠町3丁目地区他 污水管改築更新工事	(株)NEO DAISEI	148,596	H28.10.3 (H29.7.6)	H29.7.31 (H29.8.31)	制限
	29	旭ヶ丘1丁目地区他 污水管改良工事	(株)塩屋基礎	85,412	H29.2.21	H30.1.15	制限
	30	神戸三田線(有馬口) 街路築造に伴う污水管布 設工事	日本海工(株)	28,198 (23,188)	H29.4.24 (H29.8.22) (H29.9.11)	H29.8.31 (H29.9.15)	制限

建設局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	31	西河原1号雨水幹線他築 造工事(その1)	大林・寄神特 定JV	1,463,940 (1,514,808) (1,192,460)	H27.10.15 (H28.11.22) (H29.3.23)	H29.3.31 (H30.3.31)	制限 (総評)
	32	第2長藪雨水幹線 改築工事	港建設(株)	159,840 (224,618) (266,185)	H27.10.8 (H28.6.23) (H28.8.18) (H28.11.28)	H28.7.31 (H28.11.30)	制限 (総評)
	33	入江通雨水幹線他 改築工事	(株)松建	49,646 (62,649) (62,147)	H28.1.27 (H28.6.1) (H28.10.14) (H28.12.5) (H29.1.25)	H28.7.29 (H28.10.31) (H28.12.9) (H29.1.31)	制限
	34	八幡雨水幹線築造工事 (その2)	関西建設工業 (株)	189,540 (192,139) (211,626)	H28.2.9 (H28.3.1) (H28.9.26) (H29.2.21)	H28.10.31 (H29.2.28)	随契
	35	五色山雨水幹線改築工事	(株)ゴショー	71,992 (81,270)	H28.10.31 (H29.5.22) (H29.8.28)	H29.7.31 (H29.8.31)	制限
	36	魚崎ポンプ場 改築更新事業(第1期)	大林・神鋼環 境ソリューション・三菱 電機特定JV	10,065,600 (10,066,194) (10,084,392)	H28.2.29 (H29.3.16) (H29.7.10)	H35.10.31	一般 (総評)
	37	西部処理場高段ポンプ棟 他築造工事(土木)	大成・日本国 土・ハンシン 特定JV	3,087,450 (3,190,050) (3,262,582)	H27.12.8 (H28.9.13) (H29.2.6) (H29.3.29)	H29.10.31 (H30.1.14) (H30.3.31)	一般
	38	西部処理場北系水処理施 設築造工事(土木)	戸田・岩田地 崎特定JV	7,298,856 (7,312,257) (7,767,861) (8,477,211)	H28.3.24 (H28.4.21) (H29.1.27) (H29.8.22)	H31.7.31 (H31.12.28)	一般
	39	玉津処理場消化ガス精製 設備他築造工事(土木) [39土木, 43機械, 44電気]	茂富建設(株)	35,470 (35,913)	H29.1.27 (H29.5.25) (H29.7.4)	H29.6.30 (H29.7.28)	制限
設備	40	塩屋ポンプ場 電気設備工事	シンフォニア テクノロジー (株)	314,820	H29.3.22	H30.3.31	制限 (総評)
	41	垂水処理場 本場2系1・2 池生物反応槽散気装置機 械設備工事	(株)神鋼環境ソ リューション	282,204 (276,083)	H28.7.15 (H29.2.24)	H29.3.31	制限
	42	垂水処理場本場 最初沈殿池電気設備工事	三菱電機(株)兵 庫支店	305,640 (309,744)	H27.12.15 (H29.3.15)	H29.3.17	制限

建設局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	43	玉津処理場 消化ガス機械設備工事 [39土木, 43機械, 44電気]	(株)神鋼環境ソリューション	753,840	H28.12.9	H30.3.30	制限 (総評)
	44	玉津処理場 消化ガス電気設備工事 [39土木, 43機械, 44電気]	千代田興産(株)	94,651 (94,865)	H29.3.22 (H29.4.19)	H30.3.31	随契
	45	西部処理場 機械用水給水ユニット 制御盤取替工事	(株)大同電機製作所	10,756	H28.10.25	H29.3.24	指名
	46	唐櫃第1他 マンホールポンプ施設 動力制御盤更新工事	(株)アサオ	42,552	H28.9.21	H29.3.17	制限
	47	東灘処理場 こうべバイ オガスステーション点検 整備	アイテック(株) 神戸支店	5,486	H28.10.21	H28.11.30	随契
	48	垂水処理場東系水処理 脱臭設備 脱臭剤取替	日本化成(株)	14,145	H28.8.4	H29.3.31	指名
	49	玉津処理場 1号発電機エンジン改修	ダイハツ ディーゼル(株)	13,392	H28.11.2	H29.3.30	随契
	50	鈴蘭台処理場 オゾン設備点検整備	神鋼環境メン テナンス(株)	8,510	H28.12.21	H29.3.17	随契

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	51	神戸三田線 (大池駅前地区) 街路築造工事 (その5)	寄神建設(株) 関西支店	111,304 (130,701) (140,878)	H27.11.11 (H28.7.25) (H28.12.12) (H28.12.27) (H29.1.30)	H28.7.31 (H28.12.28) (H29.1.31)	制限 (総評)
	52	御崎線街路築造工事	(株)松建	35,591	H29.6.23	H30.1.19	制限

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	53	上筒井小学校・筒井台中 学校運動場整備工事	(株)大成スポーツ施設	117,612 (133,259)	H28.11.8 (H29.3.15)	H29.3.31	制限
	54	東舞子小学校 運動場改修工事	(株)丸山造園	9,849 (10,579)	H28.11.22 (H29.3.7)	H29.3.31	指名
建築	55	(仮称)東部療育センター 新築工事 [55建築, 72機械, 73電気]	湊建設工業(株)	628,776 (664,664)	H28.12.5 (H29.8.23)	H30.2.28	制限
	56	稗田小学校 昇降機棟増築他工事 [56建築, 74電気]	北摂建設工業 (株)	48,060	H29.7.24	H30.3.15	制限
	57	名谷小学校 特別教室棟増築工事 [57建築, 75機械, 76電気]	(株)伊吹工務店	213,840 (219,477)	H28.9.7 (H29.5.2)	H29.5.31	制限
	58	みなとじま会館 解体他工事	愛奈工業(株)	117,718 (150,118) (153,358)	H28.12.21 (H29.4.25) (H29.4.28)	H29.7.31 (H29.10.31)	制限
	59	金平町2丁目西団地 仮設住宅とりこわし工事	(株)極東エン タープライズ	9,273	H29.8.2	H29.10.31	指名
	60	東灘事業所 耐震改修他工事	久原建築総合 (株)	19,479 (22,541)	H28.10.21 (H29.3.8)	H29.3.18	制限
	61	真陽小学校便所改修工事	(株)辻竹建設	59,292 (59,934) (60,163)	H28.6.30 (H28.9.29) (H28.11.9)	H28.10.14 (H28.11.11)	制限
	62	高倉台小学校 屋内運動場棟 長寿命化改修工事 [62建築, 88電気]	(株)池内工務店	145,260	H29.6.7	H29.11.15	制限
	63	横尾小学校 外壁改修他工事	藤原建設(株)	179,172	H29.7.6	H30.1.31	制限
	64	神戸市看護大学ホール 吊天井脱落対策工事 [64建築, 90電気]	(株)ヒョウ工務 店	29,638	H29.6.9	H29.11.13	制限

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
建築	65	倚松庵改修工事	(株)隆建	18,340 (20,187)	H28.5.2 (H28.11.14)	H28.11.18	制限
	66	東灘処理場最初沈殿池 屋上防水改修工事	(有)行方創研	25,151 (25,152) (27,544)	H28.11.24 (H29.3.13) (H29.3.28)	H29.3.15 (H29.3.31)	制限
	67	神戸文化ホール外壁等 補強改修他工事	(株)ヒョウ工務店	45,875 (48,175)	H28.11.18 (H29.5.31)	H29.5.31 (H29.12.28)	制限
	68	産業振興センター 外壁改修他工事	(株)リキョー	44,539 (46,639)	H29.3.3 (H29.7.10)	H29.7.14 (H29.8.4)	制限
	69	荻藻島クリーンセンター 中継台整備工事	藤原建設(株)	71,539 (76,647)	H28.10.14 (H29.4.5)	H29.4.20 (H29.5.19)	制限
	70	大日丘児童館・地域福祉 センター外壁改修他工事	(株)木多工務店	13,909 (14,276)	H28.10.26 (H29.3.3)	H29.3.15	指名
	71	日向自転車駐車場 改修工事	(株)河合塗研	40,986 (44,323)	H28.9.7 (H29.3.2)	H29.3.15	制限
設備	72	(仮称) 東部療育セン ター新築機械設備工事 [55建築, 72機械, 73電気]	邦設備工業(株)	146,556	H28.12.20	H30.2.28	制限
	73	(仮称) 東部療育セン ター新築電気設備工事 [55建築, 72機械, 73電気]	(株)明和工務店	116,132	H29.4.28	H30.2.28	制限
	74	稗田小学校 昇降機設備工事 [56建築, 74電気]	日本オーチ ス・エレベ ータ(株)	10,418	H29.8.2	H30.3.15	指名
	75	名谷小学校特別教室棟 増築機械設備工事 [57建築, 75機械, 76電気]	(株)R・Planning	36,404 (36,324)	H28.11.9 (H29.5.25)	H29.5.31	制限
	76	名谷小学校特別教室棟 増築電気設備工事 [57建築, 75機械, 76電気]	(株)ショーシン	19,629 (20,444)	H28.10.14 (H29.5.26)	H29.5.31	制限

住宅都市局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	77	しあわせの森便所棟 新築機械設備工事 [77機械, 78電気]	芦田工業(株)	41,428 (41,968)	H28.11.4 (H29.5.23)	H29.5.26	制限
	78	しあわせの森便所棟 新築電気設備工事 [77機械, 78電気]	マサニ電気(株)	12,621 (11,919)	H28.10.27 (H29.5.18)	H29.5.26	指名
	79	防災行政無線デジタル 同報系拡声子局 増設他工事	西菱電機(株) 大阪支社	19,548	H28.11.21	H29.3.31	随契
	80	ふたば保育所他 6 箇所 防犯設備他設置工事	(株)大神電設	9,754 (10,109)	H29.1.23 (H29.3.28)	H29.3.31	指名
	81	大沢幼稚園他 2 園 空調設備工事	(株)R・Planning	11,321 (10,781)	H29.6.9 (H29.8.23)	H29.8.31	指名
	82	東灘区総合庁舎 蓄電池設備更新工事	太昭電設(株)	10,020	H28.10.28	H29.2.10	指名
	83	登山研修所・王子スポー ツセンター前 ガス管改修工事	大阪ガス(株) 導管事業部	13,598	H28.11.10	H29.3.31	随契
	84	神戸文化ホール 舞台照明調光卓更新工事	パナソニック E S エンジニ アリング(株)	59,724	H28.10.26	H29.3.31	制限
	85	サンセンタープラザ カーリフトたて枠 取替工事	フジテック(株)	9,979	H28.11.1	H29.3.10	随契
	86	御崎公園スタジアム芝生 育成用電気設備他 改修工事	太昭電設(株)	73,850	H29.8.8	H30.1.31	制限
	87	長田東地域福祉センター 空調設備改修工事	(株)安福冷暖	5,854 (5,649)	H28.11.24 (H29.2.24)	H29.2.28	指名

住宅都市局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	88	高倉台小学校屋内運動場 棟長寿命化改修電気設備 工事 [62建築, 88電気]	(株)日幸電商	17, 184	H29. 6. 9	H29. 11. 15	指名
	89	国民宿舍須磨荘 (シーパル須磨) 防災設備改修工事	(株)宮野電気商 会	17, 220	H28. 10. 20	H29. 2. 28	指名
	90	神戸市看護大学 ホール吊天井脱落対策 電気設備工事 [64建築, 90電気]	辻川電機(株)	12, 420	H29. 6. 20	H29. 11. 13	指名
	91	神戸市立工業高等専門学校 受変電設備改修工事	太昭電設(株)	52, 790 (53, 562)	H28. 9. 14 (H29. 1. 11)	H29. 1. 20	制限
	92	鶴越斎場他炉設備 改修工事	昭栄建設(株)	38, 296 (38, 414)	H28. 9. 9 (H29. 1. 16)	H29. 1. 20	制限
	93	甲緑小学校給水設備他 改修工事	(株)阪神ワーク ス機工	20, 211	H29. 6. 14	H29. 9. 29	制限

教育委員会事務局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	94	神戸市立学校園ガス式空 調設備定期点検業務	大阪ガス(株)	6, 585	H29. 8. 31	H30. 3. 30	指名
	95	学校園他消防設備点検業 務 3 (中央・兵庫)	(株)東洋商会神 戸	4, 730	H28. 7. 15	H29. 2. 28	指名
	96	学校園他消防設備点検業 務 5 (垂水)	(株)神防社	4, 536	H28. 7. 14	H29. 2. 28	指名

教育委員会事務局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	97	神戸市立青少年科学館 本館ガス吸収式 冷温水機分解整備	川崎冷熱工業 (株)西日本支社	4,879	H28.11.4	H29.1.20	随契

公立大学法人 神戸市外国語大学

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
建築	98	神戸市外国語大学 学舎 棟2～4階トイレ改修工事 (建築・電気設備工事) [98建築, 99機械]	(有)三興建設 工業	31,367 (31,294)	H28.12.6 (H29.3.24)	H29.3.31	制限
設備	99	神戸市外国語大学 学舎 棟2～4階トイレ改修工事 (機械設備工事) [98建築, 99機械]	(有)エンドウ	21,627 (21,705)	H28.12.15 (H29.3.24)	H29.3.31	制限
	100	神戸市外国語大学 図書 館LED照明設備改修工事	(株)タザワ電気	5,184	H29.7.26	H29.9.30	指名

備考：(1)「請負人名」欄の「特定JV」は特定建設工事共同企業体を表す。

(2)「契約の方法」欄の「一般」は一般競争入札，「制限」は制限付一般競争入札，「指名」は指名競争入札，「随契」は随意契約を表す。また，（総評）は総合評価落札方式を表す。

(3)本表は，平成29年9月30日時点における各局ならびに出資団体からの提出資料に基づき作成した。
