

工事定期監査及び出資団体工事監査結果報告

〔 行財政局、文化スポーツ局、建設局、都市局、建築住宅局
教育委員会事務局、神戸市道路公社、神戸市公立大学法人 〕

神戸市監査委員	細	川	明	子
同	大	澤	和	士
同	福	本	富	夫
同	山	下	てん	せい

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項、第 4 項の規定に基づき実施した令和 7 年度第 2 期工事定期監査、出資団体工事監査について、同条第 9 項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり決定した。

1 監査の対象

行財政局、文化スポーツ局、建設局、都市局、建築住宅局、教育委員会事務局、神戸市道路公社、神戸市公立大学法人における令和6、7年度施行工事について監査を行った。

工事の抽出状況は第1表、抽出工事は第2表のとおりである。

2 監査の期間

令和7年10月30日～令和8年3月25日

3 監査の方法

監査は、土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているか（合規性）、また3E（経済性、効率性、有効性）ならびに正確性、安全性などの観点から適切に行われているかについて、関係書類の審査、現場の施工状況の調査及び関係職員に対する質問等の方法により実施した。

4 対象工事の抽出

対象工事の中から、対象局・団体の工事件数の割合、規模、内容、契約方法、工期、進捗状況等を総合的に考慮し、監査を行う工事を抽出した。

5 監査項目及び着眼点

抽出した工事に対して、下表に示す監査項目及び着眼点に基づいて監査を行った。加えて過去の指摘、事故の発生状況、社会動向、市民ニーズ、法令・技術基準等の改正への対応等の共通リスクや、対象局・団体の固有リスクを評価し、以下の重点項目を定めた。この重点項目については、関係する着眼点の中で重点的に調査、確認を行った。

① 工事の安全管理

工事において、墜落・転落、地下埋設物（インフラ）損傷といった事故が多く発生しており、作業時の安全管理を適正に行う必要がある。

② 適正な積算と工期

工事定期監査において、積算の誤りに関する指摘が続いていることや、週休2日制工事の導入に伴い適正な工期設定が必要となる。

③ 物価高騰への対応

物価高騰に対して、実勢価格に応じた単価の使用や、スライド条項（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更を請求できる制度）等の契約変更による価格転嫁を適切に行う必要がある。

また近年、南海トラフ地震や集中豪雨の増加による災害が懸念されている他、全国的に下水道管等の老朽化が課題となっているため、防災・減災への取組について確認を行った。

あわせて、環境への配慮、新技術導入等の取組についても確認を行った。

監査項目	着 眼 点
1. 計 画	計画書、事前協議及び諸手続の状況
2. 設 計	設計の基本的事項、関係法規等の適用、設計基準等の整備状況及びその運用、設計図書の見直し、設計の見直し
3. 積 算	積算基準等の整備状況及びその運用、工種・数量・単価・歩掛り等の適用、積算の見直し
4. 契 約	契約締結手続、設計変更等の理由、手続及び内容
5. 施 工	工事関係法規等、施工管理、工事関係書類、監督業務
6. 検 査	検査関係書類
7. 維持管理	保守点検関係書類
8. 委託業務	委託業務関係書類
9. 内部統制	リスクの評価と対応及び統制活動、情報の伝達状況

6 監 査 の 結 果

(1) 監査結果の概要

監査の結果、対象となる局・団体の抽出工事の実施に関する全般的な事務処理は、おおむね適正に行われているものと認められた。しかし、事務の一部について改善を要する事例が見られた。

ア 指摘事項、意見

3局1団体に対して、積算1件、施工2件の指摘及び契約1件、施工2件の意見を行った。積算及び施工の内4件については重点項目に該当する内容であった。

今期の特徴として、発注者が、請負人から提出された書類の誤りに気付かず、施工体制の不備を放置したまま工事が実施された事例が2件認められた。発注者は、適切な施工体制の確保の重要性を強く認識し、現場確認を疎かにせず、請負人への監督指導を徹底されたい。

イ 指導

指摘事項及び意見の他、下記のような事例等については監査実施の際、関係職員に口頭等で指導を行った。

(ア)人命に直結しない安全管理の不足

脚立の天板をまたいでの作業や、配管上など足元が不安定な状態での作業。

(イ)軽微な積算の誤り

数量の計上や単価選択等の軽微な誤り。

(ウ)軽微な工事書類の不備

工事書類の提出の遅れや、添付書類の不足。

ウ 環境への配慮、新技術導入等の取組

環境への配慮や新技術導入等の取組の視点で監査を実施した結果、以下のような取組事例が見られた。

(ア) 建設局


電線共同溝^(注)の整備工事においては、市街地の幹線道路であり地下埋設物が輻輳していたため、掘削工事の前に地中レーダーによる探査を実施し、既設埋設管の位置・深さの把握を行っていた。これにより、掘削時に既設埋設管を損傷するリスクを低減し、安全性の確保と工程管理の精度向上に大きく寄与した。

(注) 電線共同溝

景観の向上や通行空間の確保、災害の防止を目的として、道路下に管路を敷設し、電線類を地中に収納するもの。



〈地中レーダー探査結果イメージ〉

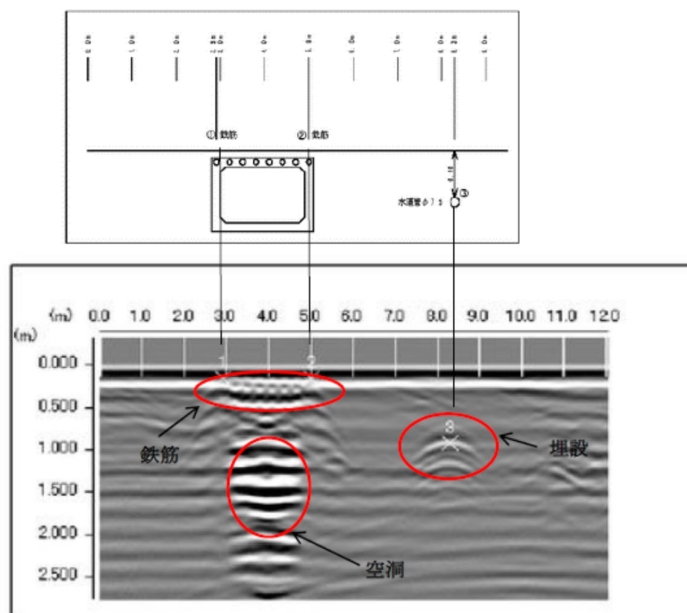


(イ) 建築住宅局

神戸市歴史公文書館の新築工事において、本館では歴史的公文書及び地域歴史資料を守るため、3重壁により外壁に高い断熱性能を持たせ、恒温恒湿ゾーンを設けることにより最適な保存環境を整備すると共に、ランニングコストの低減のため、省エネルギーに配慮した設備機器を設置していた。


本市では、「神戸市地球温暖化防止実行計画（令和5年3月改定）」に基づき、新築建物については、原則ZEB Oriented^(注)相当以上の省エネルギー性能の確保を目標としており、本建物は先行してその目標を達成していた。

(注) ZEB Oriented（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング オリエンテッド）

快適な室内環境を実現しながら、平成28年の省エネ基準による年間の一次エネルギー消費量を基準とし、建物で消費する年間の一次エネルギーの消費量削減率を30～40%以上とすることを旨とした建物。

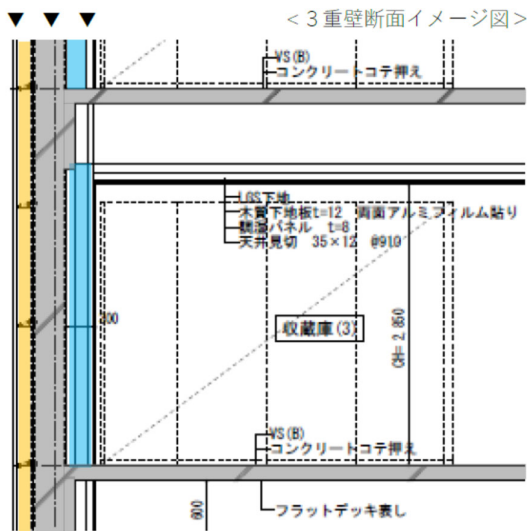

- 外壁側通気層 ■
- 内壁側通気層 ■

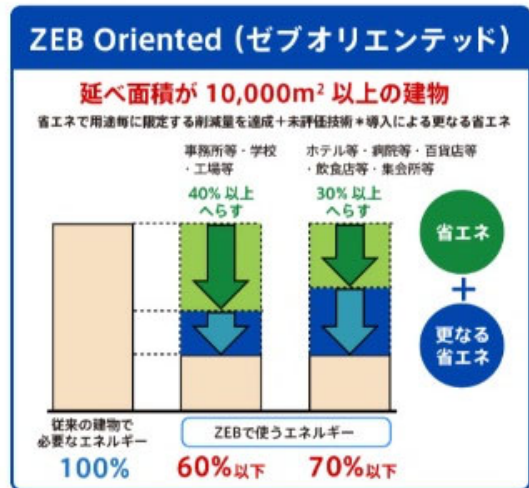

(2) 監査結果

○ 指摘事項

ア 積算（重点項目：「適正な積算と工期」）

(ア) 変更契約時の積算を適正に行うべきもの

本工事は、神戸市道路公社が管理する山麓バイパス布引トンネルの受変電設備の更新を行うものである。

本工事では、契約後に維持管理を考慮して受変電設備の仕様を変更している。その一つとして、所内変圧器盤の仕様を変更し、金額の変更を行っている。

所内変圧器盤の変更内容は、部分的な仕様変更であるが、積算上は所内変圧器盤全体を一つの単価としているため、仕様が異なる別の所内変圧器盤の単価に入れ替える必要があった。

そのため、当初の設計で計上した所内変圧器盤の金額を減額し、仕様を変更した所内変圧器盤の金額を計上する必要があったが、当初の設計で計上した所内変圧器盤の金額の減額ができておらず、設計金額が過大となっていた。

本工事においては、チェックリストによる確認が行われていなかった。変更契約時は作業時間の確保が難しく誤りが発生しやすいため、チェックリスト等を活用し、適正な積算を徹底すべきである。

(神戸市道路公社道路管理部設備課)

[No. 68 布引トンネル受変電設備更新工事]

(請負金額 652,190 千円)

イ 施工

(ア) 安全な施工のため請負人を適正に監督指導すべきもの（重点項目：「工事の安全管理」）

本工事は、兵庫区平野町の国道 428 号において、道路法面の災害を未然に防止し、道路防災対策の強化を図るものである。

本工事は、急勾配斜面での作業を含む危険性の高い工事であり、下請負人の作業員が転落するという重大な労働災害が発生していた。この事故は、本体工事着手前の準備である樹木伐採作業中に転落防止措置が不十分であったことが原因で生じたものであり、請負人はこの事故により指名停止処分を受けている。

このような状況を踏まえると、事故発生後の対策として安全管理をより徹底して行う必要があり、それには施工体制と作業内容の把握が必須となる。しかし請負人は、本工事の主たる作業を行わせていた別の下請負人 1 社について、契約は締結していたものの、「建設業法」に作成が義務付けられている施工体制台帳に記載しておらず、安全管理を

十分に行っているとは言い難い状況であった。

また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」には、発注者は工事現場の施工体制を適正なものとするため、施工体制台帳の記載内容と工事現場の施工体制が一致しているか点検するなど、必要な措置を講じなければならないと規定されている。しかし発注者は、施工体制台帳に記載のない下請負人が本工事の主たる作業を継続して行っていたにもかかわらず、現場での確認が十分でなく、その状況を見落としていたため、工事を一時中止させ施工体制台帳へ記載させるなど必要な監督指導を実施していなかった。

発注者は、神戸市施工体制確認要領等のチェックツールを活用し、施工体制の確認を確実に行うべきである。加えて、本工事では危険性の高い作業を伴い、重大な労働災害が発生していたことから、重点的に監督できる体制を構築し、請負人を適正に監督指導すべきであった。



(建設局道路工務課、建設局中部建設事務所)

[No. 11 国道 428 号道路防災対策工事(その 3)]

(請負金額 206,740 千円)

(イ) 請負人の施工体制を適正に監督指導すべきもの

本工事は、灘区総合庁舎においてエレベーターの更新を行うものである。

本工事では、エレベーターの設置に伴う電気の配線工事について、請負人は下請負人と契約を締結しており、施工体制台帳にはこの下請負人に関する資料として電気工事業者登録証が添付されていた。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」では、電気工事業を営む場合、取り扱う電気工事の種類に応じた電気工事業者登録が必要である。この下請負人の登録内容は、一般用電気工作物^(注1)であり、本工事で必要な自家用電気工作物^(注2)ではなかった。

請負人は、下請負人に電気工事を依頼する場合、当然のことながら、下請負人がその工事を請負えるかを建設業許可証や電気工事業者登録証等により確認する必要がある。しかし、本工事ではその確認が不十分であった。

発注者は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、施工体制台帳の記載内容と工事現場の施工体制が合致しているどうかの点検、その他必要な措置を講じる必要がある。

工事の品質を確保するため、下請負人を含めた施工体制全体をチェックリスト等を用いて確認し、適正な許可や登録がされた事業者により工事が施工されるよう請負人への監督指導を徹底すべきである。

(注1) 一般用電気工作物：一般家庭など電気を低圧で受電する電気設備

(注2) 自家用電気工作物：工場やビルなど電気を高圧で受電する電気設備

(建築住宅局設備課)

[No. 59 灘区総合庁舎昇降機設備更新工事]

(請負金額 190,762 千円)

○ 意 見

ア 契 約

(ア) 工事委託の変更契約について

本工事委託業務は、神戸市立布引中学校において、電気を受電するために必要な受変電設備の一部を改修するものである。

本業務では、当初契約は受変電設備の一つである変圧器の更新のみを行う契約となっていたが、変更契約により電柱、開閉器、高圧ケーブルの更新を追加している。

追加した設備は、受変電設備に関連するものであり、施工場所も同一であることから、既に現場を把握している受託者に施工させていた。

しかし、変更契約については、本市の「委託契約に関する解説及び記載例」に、当初契約を競争入札、見積合せ、プロポーザルで行った場合は、契約条項を変更することは軽微な事項を除いては原則として許されないと記載されている。

本業務は当初契約時に見積合せを行っており、変更契約の金額は、当初契約の金額に対して高額であることから軽微な変更とは言えない。また、当初契約と変更契約の工事は、別の日程で行われており、別契約とすることが可能であった。

工事委託の契約では、受注機会の公平性や競争性を考慮する必要があるため、業務内容の追加や変更が生じた際は、内容を精査し、軽微な変更以外は別契約として競争入札とする等、適切な事務手続に努められたい。

(教育委員会事務局学校環境整備課)

[No. 64 神戸市立学校受変電設備改修事業 (その1)]

(委託金額 8,739 千円)

イ 施 工（重点項目：「工事の安全管理」）

（ア）玉掛け作業の安全確保における監督指導について


本工事は、都市計画道路垂水妙法寺線において、道路拡幅のために橋梁を架設するものである。

厚生労働省の「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」では、汎用クランプを使用する場合は、つり荷の形状に適したものを少なくとも2個以上使用することとされている。

しかし、工事記録写真では、土留工に使用した仮設鋼材を搬出する際、汎用クランプ1個で玉掛けされており、ガイドラインに反している状態であった。

発注者は、施工計画書が提出された際には、事前に作業手順や安全性を確認すると共に適宜現場確認を行い、請負人への安全管理の監督指導に努められたい。加えて、工事完成時には関係書類の確認を行い、法令違反や不適切な事項が認められた場合には、再発防止について監督指導されたい。

※玉掛け：つり具を用いて行う荷掛け及び荷外しを行う作業。

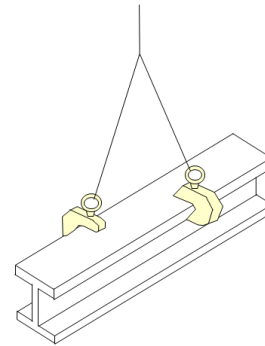

（例）クランプ2個の場合

（建設局道路工務課、建設局西部建設事務所）

[No. 7 上与市橋他一橋架設工事]

（請負金額 241,756 千円）

(イ) 高所作業の安全確保における監督指導について

本工事は、豪雨により崩壊した北区淡河町淡河の国道 428 号において、道路法面の復旧を行う工事である。

「労働安全衛生規則」には、高さ 2m 以上の箇所で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難な時は、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない、と規定されている。

しかし、工事記録写真では、支障となる樹木をトラックに積載する際、目視による状況確認を行うため作業員がトラックのキャビン上（高さ:約 2.5m）に登っているが、墜落防止に必要な安全措置を講じていなかった。

発注者は、施工計画書が提出された際には、事前に作業手順や安全性を確認すると共に適宜現場確認を行い、請負人への安全管理の監督指導に努められたい。加えて、工事完成時には関係書類の確認を行い、法令違反や不適切な事項が認められた場合には、再発防止について監督指導されたい。



(建設局道路工務課、建設局北建設事務所)

[No. 16 国道 428 号 (淡河町淡河) 災害復旧工事]

(請負金額 119,452 千円)

第 1 表 抽出状況表

工事定期監査

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
行 財 政 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	—	—	—	—	—	—
	設 備	28	488,136	3	38,042	10.7	7.8
文 化 ス ポ ー ツ 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	12	1,323,137	1	804,870	8.3	60.8
	設 備	27	1,272,979	2	279,477	7.4	22.0
建 設 局	土 木	240	26,547,754	14	3,335,113	5.8	12.6
	建 築	—	—	—	—	—	—
	設 備	149	41,238,033	13	12,224,095	8.7	29.6
都 市 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	8	1,820,202	1	741,565	12.5	40.7
	設 備	19	279,821	3	80,724	15.8	28.8
建 築 住 宅 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	126	40,502,953	11	5,855,606	8.7	14.5
	設 備	161	12,468,507	12	1,335,819	7.5	10.7
教 育 委 員 会 事 務 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	17	1,045,931	1	89,452	5.9	8.6
	設 備	38	702,182	4	57,242	10.5	8.2
計		825	127,689,635	65	24,842,005	7.9	19.5

出資団体工事監査

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
神 戸 市 道 路 公 社	土 木	17	1,663,628	1	200,418	5.9	12.0
	建 築	—	—	—	—	—	—
	設 備	27	5,254,361	2	1,271,490	7.4	24.2
神 戸 市 公 立 大 学 法 人	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	2	114,400	1	59,730	50.0	52.2
	設 備	3	157,223	1	47,795	33.3	30.4
計		49	7,189,612	5	1,579,433	10.2	22.0

合 計

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
計		874	134,879,247	70	26,421,438	8.0	19.6

備 考：(1)監査対象工事は、契約金額250万円以上のものとした。

(2)本表は、令和7年8月31日時点における契約監理システムのデータと各局及び出資団体からの提出資料に基づき作成した。

第 2 表 抽出工事一覧表

行財政局

工事種別	番号	工事名	受注者名	金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の 種類
設備	1	本庁舎空調機他エアフィルター 取替業務	ヤマトヨ産業 (株)	6,490	R6.4.1	R7.3.31	その他請負
	2	本庁舎1号館エレベーター保守点 検業務	三菱電機ビルソ リューションズ (株) 関西支 社	27,482	R6.4.1	R7.3.31	その他請負
	3	本庁舎受変電設備 GISガス回収 作業	三菱電機プラント エンジニアリ ング(株) 西 日本本部	4,070	R6.10.7	R6.12.31	その他請負

文化スポーツ局

工事種別	番号	工事名	受注者名	金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の 種類
建築	4	青少年科学館展示室等改修業務	トータルメディア・ 神戸新聞事業者 共同企業体	798,600 (804,870)	R5.10.26 (R6.10.1)	R7.3.25	工事委託
設備	5	長田区文化センター別館ボイラー 他更新業務	セーバー技研 (株)	6,677	R6.12.19	R7.3.28	工事委託
	6	灘区民ホール可動床制御システム 他整備業務	三菱重工機械シ ステム(株)	272,800	R6.11.27	R8.3.31	その他請負

建設局

工事 種別	番号	工事名	受注者名	金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 種類
土木	7	上与市橋他一橋架設工事	協同建設 (株)	324,280 (326,926) (241,756)	R5. 1. 24 (R6. 3. 25) (R7. 1. 22)	R7. 1. 31	工事請負
	8	長田楠日尾線 (熊内) 電線共同溝 整備工事 (その2)	港建設 (株)	288,210 (297,047) (347,661)	R5. 3. 7 (R5. 10. 27) (R7. 1. 20) (R7. 3. 26)	R7. 1. 31 (R7. 3. 31)	工事請負
	9	渦森台1号線道路防災対策工事	(株) 大野	76,230 (190,830) (188,077)	R5. 5. 30 (R5. 11. 24) (R6. 3. 6) (R6. 5. 30) (R7. 1. 31)	R6. 1. 31 (R6. 3. 10) (R6. 5. 31) (R7. 1. 31)	工事請負
	10	山麓線 (高羽) 街路築造及び電線 共同溝整備工事 (その2)	十河建設 (株)	126,535 (165,580)	R5. 6. 19 (R6. 3. 27) (R6. 9. 3) (R7. 1. 24)	R6. 3. 29 (R6. 10. 31) (R7. 1. 31)	工事請負
	11	国道428号道路防災対策工事(その 3)	(株) HOUR YU	113,718 (134,901) (196,175) (206,740)	R5. 8. 2 (R6. 3. 27) (R6. 5. 15) (R6. 9. 27) (R6. 10. 29)	R6. 3. 29 (R6. 5. 16) (R6. 9. 30) (R6. 10. 31)	工事請負
	12	樋谷第二大橋耐震補強工事その2	窪田工業 (株)	407,000 (410,966) (446,048) (448,566)	R5. 9. 26 (R6. 9. 12) (R7. 1. 9) (R7. 3. 26) (R7. 5. 29)	R7. 3. 31 (R7. 5. 30)	工事請負
	13	神戸三木線 (木見西) 道路改良工 事	関西建設工業 (株)	288,530 (283,258)	R6. 1. 10 (R6. 11. 29) (R7. 2. 26)	R6. 12. 27 (R7. 2. 28)	工事請負
	14	高尾美ノ谷線道路防災対策工事	北神吉田建設 (株)	7,150 (10,721)	R6. 8. 21 (R6. 12. 25)	R6. 12. 27	工事請負
	15	三宮北交差点改良工事 (その2)	(株) 山田工務 店	296,835 (323,268)	R6. 10. 15 (R7. 7. 14)	R7. 7. 31 (R7. 9. 30)	工事請負
	16	国道428号 (淡河町淡河) 災害復 旧工事	(株) 朱門建設 工業	63,729 (84,212) (119,452)	R6. 10. 28 (R7. 3. 25) (R7. 6. 24)	R7. 3. 31 (R7. 6. 30) (R7. 9. 30)	工事請負
	17	長尾橋耐震補強・補修工事	港建設 (株)	141,658	R7. 6. 18	R8. 7. 31	工事請負
	18	岡場駅前広場再整備工事その1	八雲建設 (株)	316,509 (317,714) (346,664) (351,359) (353,691)	R5. 9. 15 (R6. 3. 18) (R6. 11. 7) (R7. 3. 12) (R7. 6. 24)	R7. 3. 14 (R7. 6. 30)	工事請負
	19	地下鉄長田駅前空間再整備工事	大志総業 (株)	117,700 (135,831)	R6. 1. 10 (R6. 9. 13)	R6. 11. 29	工事請負
	20	垂水駅東線道路改良工事	港建設 (株)	229,206 (336,691) (368,863)	R6. 7. 4 (R7. 3. 26) (R7. 8. 18)	R8. 3. 31	工事請負

都市局

工事種別	番号	工事名	受注者名	金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 種類
建築	34	向洋南駐車場とりこわし及び敷地整備工事	(株)上田トランシットコンストラクション	741,565	R7.3.31	R8.3.19	工事請負
設備	35	深江浜中および南ポンプ場ポンプ設備整備	新菱工業(株) 関西支店	55,220	R6.8.23	R7.3.24	その他請負
	36	垂水地区駐車場キャッシュレス化及び新規紙幣対応に係る改造・更新業務	アマノ(株)	16,705	R6.7.31	R6.12.27	工事委託
	37	リバーモールI期ライトアップ照明補修	(株)三宅電気工事	8,800	R6.9.6	R6.12.20	その他請負

建築住宅局

工事種別	番号	工事名	受注者名	金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 種類
建築	38	西神中央駅西側駅前広場再整備工事その3	藤原建設(株)	331,454 (362,269) (357,550)	R5.6.16 (R7.1.16) (R7.2.27)	R7.2.28	工事請負
	39	(仮称)新垂水図書館・自転車駐車場・ロータリー建設工事 [49機械] [54電気] [55電気]	明和・ニッケみらい特定建設工事共同企業体	2,057,000 (2,130,942) (2,209,174) (2,261,039) (2,309,538)	R5.9.21 (R6.11.12) (R6.12.23) (R7.5.29) (R7.8.26)	R7.5.31 (R7.8.29)	工事請負
	40	兵庫商業高等学校とりこわし工事	(株)はるかわ	323,345 (323,807) (427,966) (388,289)	R5.12.8 (R6.10.24) (R6.11.14) (R7.1.8)	R6.10.31 (R6.11.21) (R7.1.15)	工事請負
	41	旧神戸摩耶ロッジ解体工事	(株)大一	169,551 (156,285) (151,269) (148,970) (171,432)	R5.12.14 (R6.7.25) (R6.12.18) (R7.1.23) (R7.2.25) (R7.2.28)	R6.12.20 (R7.1.28) (R7.2.28)	工事請負
	42	(仮称)神戸市歴史公文書館新築他工事 [51機械] [56電気] [57電気]	寄神建設(株)	839,300 (869,594)	R6.2.21 (R7.1.20)	R7.10.15	工事請負
	43	中央小学校大規模改修工事	溝口建設(株)	254,353 (277,607)	R6.6.27 (R7.2.18)	R7.2.28	工事請負
	44	つつじが丘小学校大規模改修他工事	(株)カワサキライフコーポレーション	241,560 (269,269)	R6.7.2 (R7.3.13)	R7.3.14	工事請負
	45	西代中学校大規模改修工事	明石土建(株)	250,325 (278,573)	R6.7.3 (R7.3.13)	R7.3.17	工事請負
	46	魚崎小学校大規模改修工事	藤原建設(株)	329,780 (333,520) (353,122)	R6.7.4 (R7.2.18) (R7.3.5)	R7.3.14	工事請負
	47	(仮称)五色塚古墳ガイダンス施設整備工事 [52機械]	ニッケみらい建設(株)	150,920 (151,844) (193,446)	R6.12.4 (R7.3.17) (R7.8.27)	R7.8.29 (R7.10.31)	工事請負
48	旧駒ヶ林公会堂耐震改修他事業	(株)ビームスコンストラクション	387,189	R6.10.21	R7.12.26	工事委託	

建築住宅局

工事 種別	番号	工事名	受注者名	金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 種類
設備	49	(仮称) 新垂水図書館建設他機械 設備工事 [39建築] [54電気] [55電気]	有元温調 (株)	214,500 (215,633) (220,539)	R5.12.7 (R7.5.27) (R7.7.24)	R7.5.31 (R7.7.31)	工事請負
	50	神出自然教育園空調設備改修工事	(株) トータル	51,590 (51,953)	R6.2.16 (R7.2.21)	R7.2.28	工事請負
	51	(仮称) 神戸市歴史公文書館新築 他機械設備工事 [42建築] [56電気] [57電気]	(株) 本庄商会	196,570	R6.3.15	R7.10.15	工事請負
	52	(仮称) 五色塚古墳ガイダンス施 設整備機械設備工事 [47建築]	(有) エス・ ケー工業	20,436 (20,920)	R6.12.12 (R7.8.27)	R7.8.29 (R7.10.31)	工事請負
	53	成徳小学校給水設備改修工事	安部電気工事 (株)	26,510	R7.3.3	R7.9.30	工事請負
	54	(仮称) 新垂水図書館建設他電気 設備工事 [39建築] [49機械] [55電気]	ミナト電気工事 (株)	182,600 (183,711) (189,882)	R5.12.6 (R7.5.15) (R7.7.30)	R7.5.31 (R7.7.31)	工事請負
	55	(仮称) 新垂水図書館建設他昇降 機設備工事 [39建築] [49機械] [54電気]	フジテック (株)	63,555 (65,601)	R5.12.22 (R7.3.28) (R7.5.20)	R7.5.31 (R7.7.31)	工事請負
	56	(仮称) 神戸市歴史公文書館新築 他電気設備工事 [42建築] [51機械] [57電気]	杉本電気工事 (株)	142,780	R6.3.14	R7.10.15	工事請負
	57	(仮称) 神戸市歴史公文書館新築 他昇降機設備工事 [42建築] [51機械] [56電気]	フジテック (株)	20,467 (20,527)	R6.3.13 (R7.8.28)	R7.10.15	工事請負
	58	東灘処理場管理本館他消防設備改 修工事	(株) ナカケン	53,820 (54,370)	R6.11.5 (R7.3.17)	R7.3.21	工事請負
	59	灘区総合庁舎昇降機設備更新工事	日本オーチス・ エレベータ (株)	188,100 (190,762)	R6.2.29 (R7.3.19)	R7.3.21	工事請負
	60	東クリーンセンター照明設備改修 工事	太昭電設 (株)	130,680 (155,408)	R6.8.16 (R7.1.29)	R7.1.31	工事請負

教育委員会事務局

工事種別	番号	工事名	受注者名	金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 種類
建築	61	令和7年度学校施設屋内運動場床改修(その1)	(有)藤井建設工業	89,452	R7.6.12	R8.3.31	工事委託
設備	62	舞子小学校大規模改修工事に伴う空調機移設	神戸学校空調サービス(株)	4,686	R7.7.22	R7.9.30	その他請負
	63	御影小学校給食室設備配管更新業務	(株)新和照会	10,560	R7.6.30	R7.10.31	工事委託
	64	神戸市立学校受変電設備改修事業(その1)	(株)はなくま電工	2,057 (8,740)	R6.5.22 (R7.1.28)	R7.3.31	工事委託
	65	神戸市立学校受変電設備更新事業(その2)	(株)前角電気	32,230 (33,257)	R6.6.18 (R7.2.27)	R7.3.31	工事委託

神戸市道路公社

工事種別	番号	工事名	受注者名	金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 種類
土木	66	奥沢橋他1橋耐震補強工事	(株)U-T E C H	197,527 (200,419)	R6.6.19 (R7.3.21)	R7.3.31	工事請負
設備	67	布引トンネル換気設備更新工事	パナソニック環境エンジニアリング(株)	619,300	R6.10.7	R8.9.30	工事請負
	68	布引トンネル受変電設備更新工事	(株)日立製作所	631,730 (652,190)	R5.3.30 (R7.3.12)	R7.3.14	工事請負

神戸市公立大学法人

工事種別	番号	工事名	受注者名	金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 種類
建築	69	神戸市立工業高等専門学校ものづくりテストフィールド整備事業委託契約	溝口建設(株)	59,730	R7.2.13	R7.8.31	工事委託
設備	70	個人研究棟他5棟給排水設備更新工事及び個人研究棟他8棟消火設備更新工事	近畿総合設備(株)	47,795	R7.2.1	R7.6.30	工事請負

備考：表は令和7年8月31日時点における契約監理システムのデータと各局及び出資団体提出資料から作成。
